



MESTNA OBČINA MARIBOR



via vita

POSVET DRUŠTVA ZA CESTE SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

**MARIBORSKI PROMETNI INFRASTRUKTURNI IZZIVI DO LETA 2030**

# NAČRTOVANJE IN IZVEDBA DRŽAVNIH IN OBČINSKIH CESTNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV NA OBMOČJU MO MARIBOR

dr. Samo peter Medved, Mestna občina Maribor

Suzana Fras, Mestna občina Maribor

Maribor, 25. 5. 2022



Fakulteta za gradbeništvo,  
prometno inženirstvo in arhitekturo



Gospodarska  
zbornica  
Slovenije  
Zbornica gradbeništva in  
industrije gradbenega materiala



Na območju MO Maribor je v teku veliko število državnih infrastrukturnih projektov, za katere so podpisani Sporazumi o sofinanciranju in sicer za:

- Zahodna obvoznica – 1. etapa - Lackova – Kardeljeva
- Cesta R2-435/1431 Podaljšek Ceste proletarskih brigad
- Izvedba podvoza Ledina v Mestni občini Maribor

Za gradnjo spodaj navedenih cest je še potrebno skleniti Sporazume:


- Zahodna obvoznica – 2. in 3. etapa – Kardeljeva – priključek na AC
- Cesta R3-937/8710 Bresternica – Jurij
- Cesta R3-709/8615 Malečnik
- Malečniški most čez Dravo v Mariboru
- Mestni predor v Mariboru

Navedene investicije so tudi predmet **Protokola o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov na širšem območju Maribor, ki je bil podpisan med MzI in MOM dne 7.4.2022**






MESTNA OBČINA MARIBOR

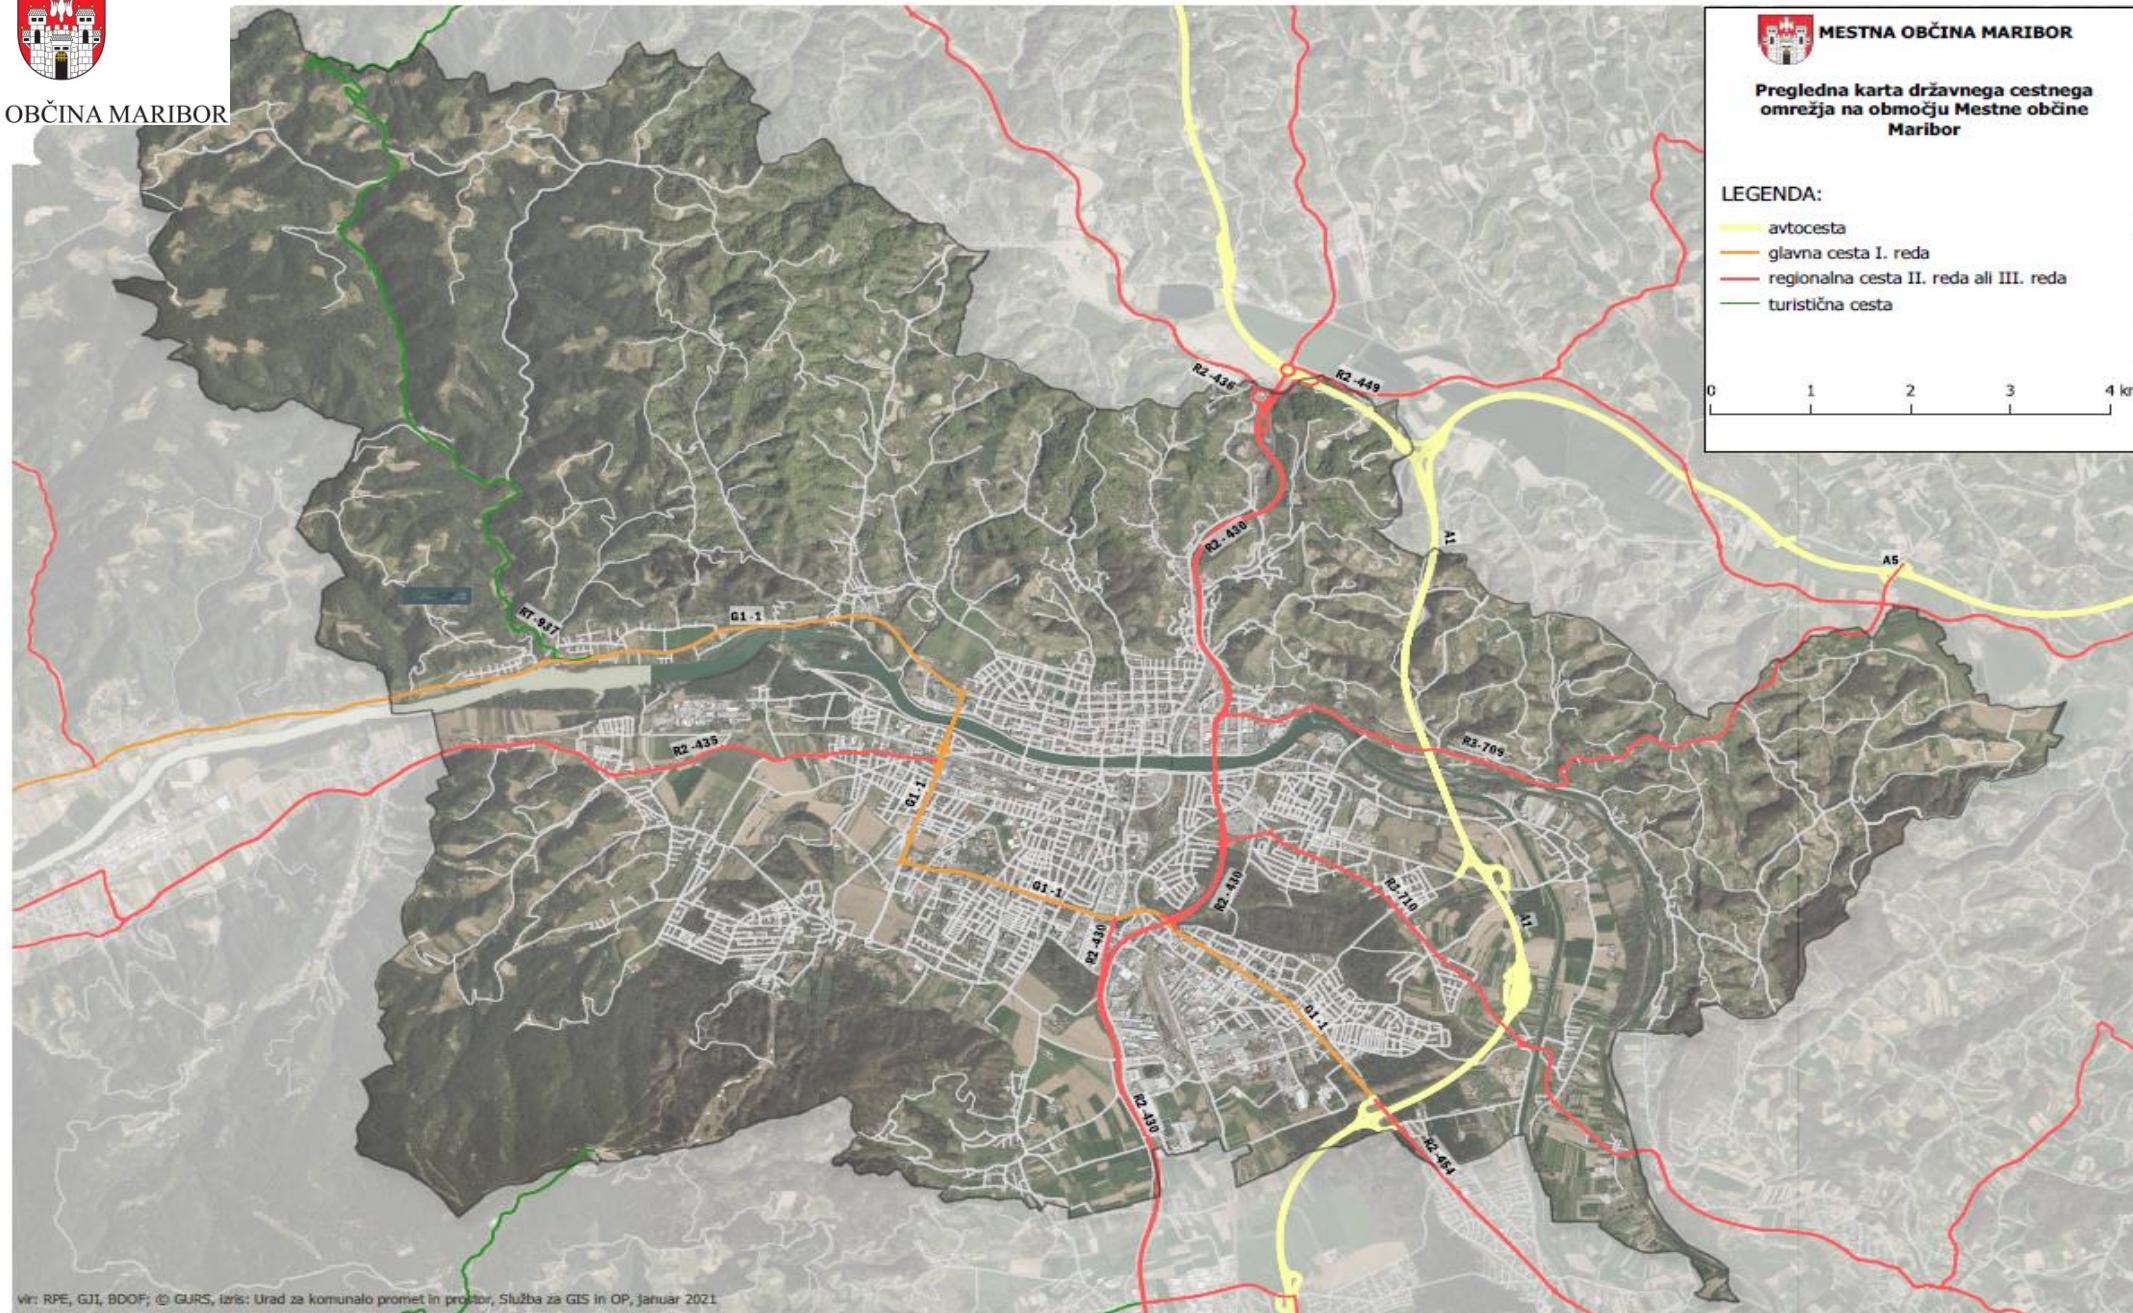

Viri: RPE, GJI, BDOF; © GURS, izris: Urad za komunalno promet in prostor, Služba za GIS in OP, januar 2021



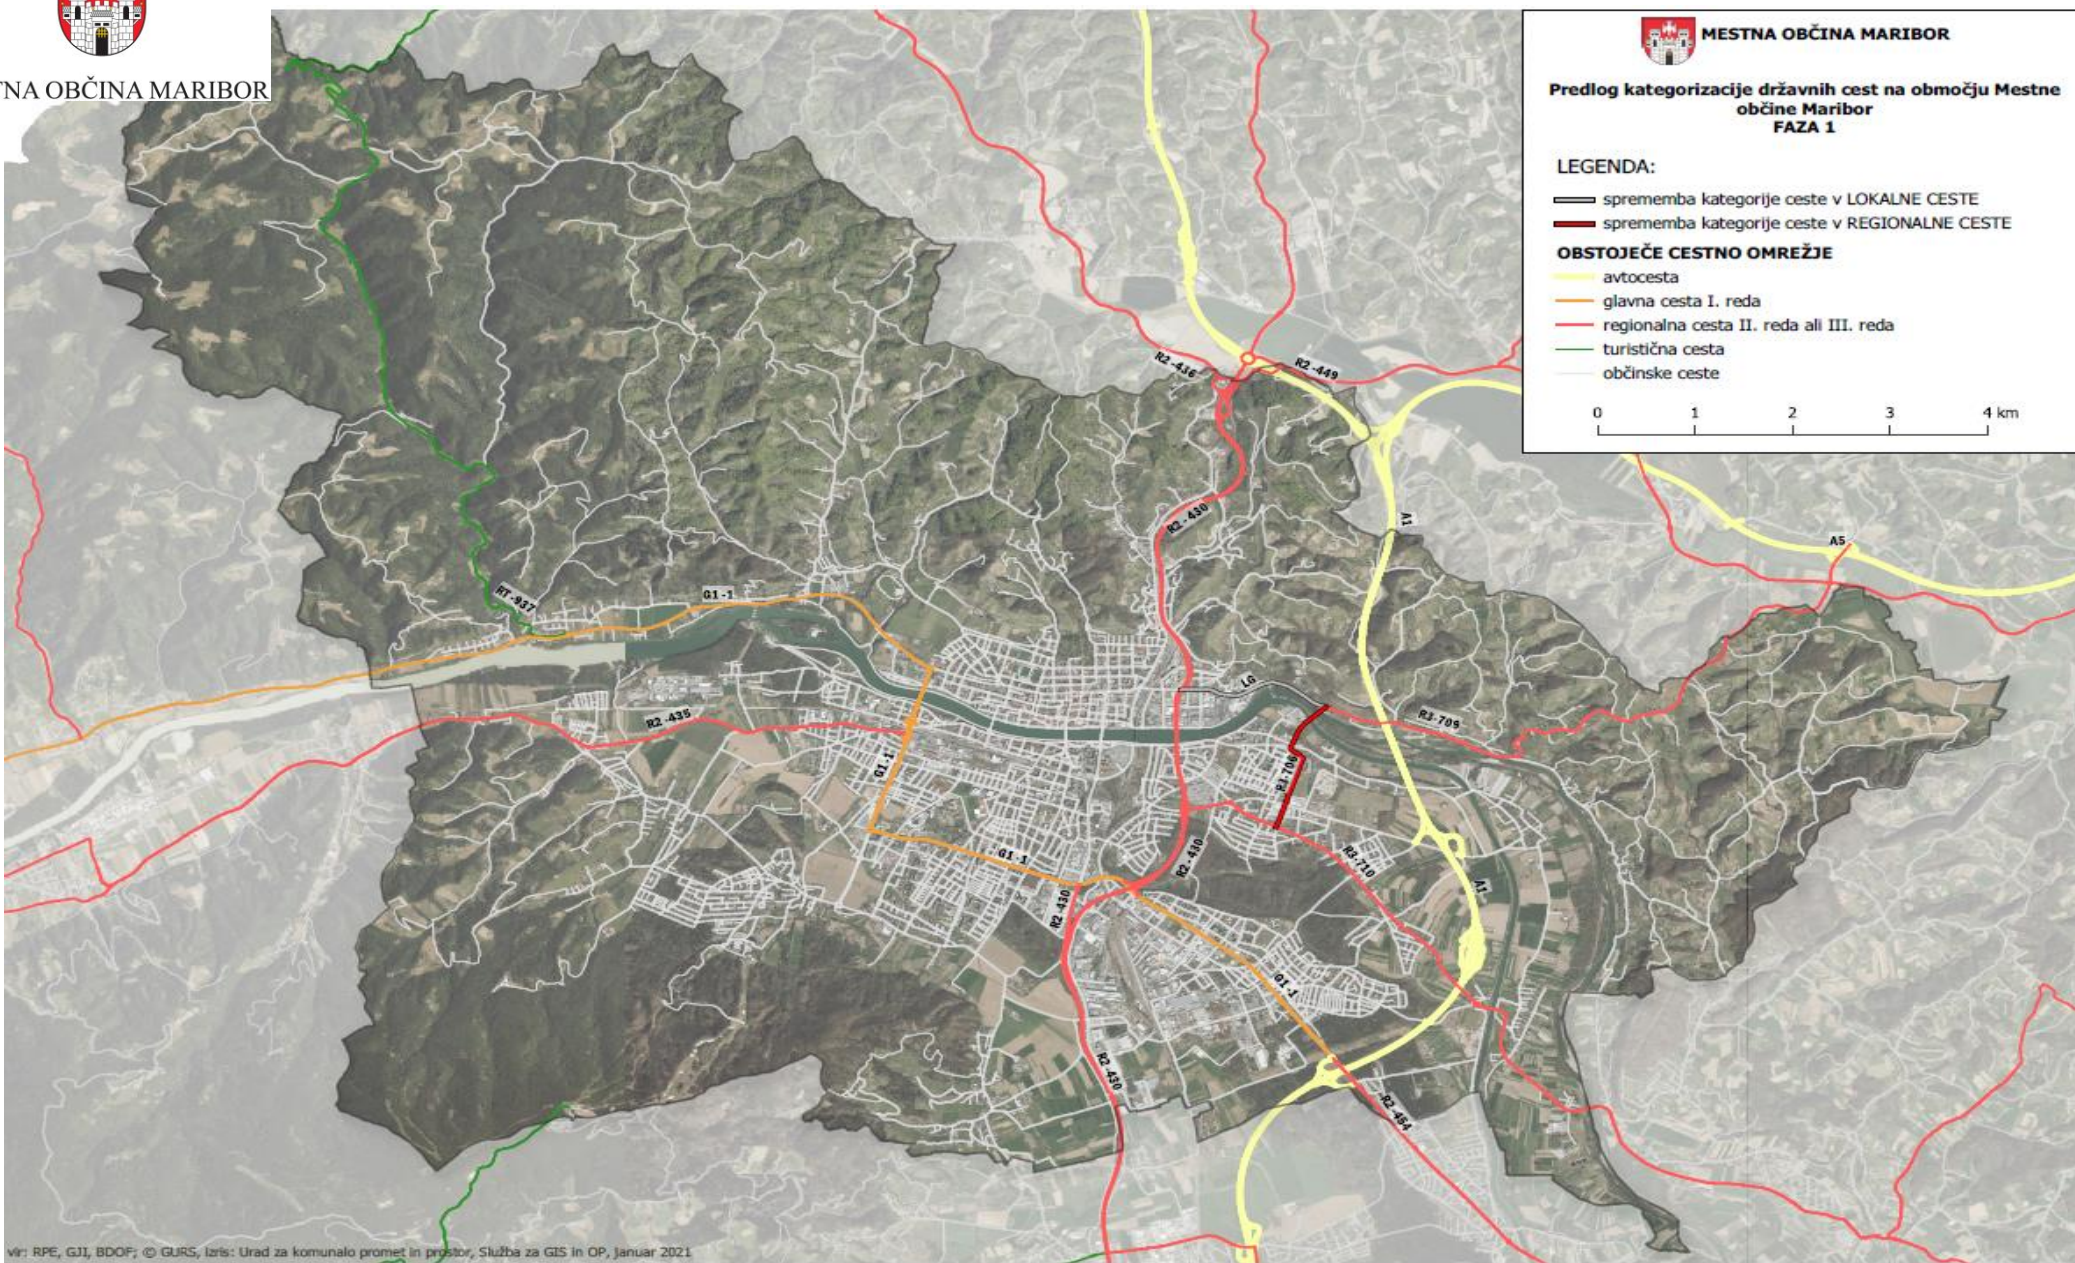






**Predlog kategorizacije državnih cest na območju Mestne občine Maribor  
FAZA 2- KONČNA**

**LEGENDA:**

- predvidena trasa OBČINSKE CESTE (podaljšek Puhove do Pariške komune)
- predvidena trasa - REGIONALNE CESTE
- predvidena trasa - GLAVNE CESTE
- sprememba kategorije v LOKALNE CESTE
- sprememba kategorije v REGIONALNE CESTE
- sprememba kategorije v GLAVNE CESTE
- občina DUPLEK - sprememba kategorije v REGIONALNE CESTE

**OBSTOJEČE CESTNO OMREŽJE**

- avtocesta
- glavna cesta I. reda
- regionalna cesta II. reda ali III. reda
- regionalna cesta- turistična cesta
- glavna mestna cesta
- zbirna mestna ali krajevna cesta
- mestna ali krajevna cesta
- lokalna cesta, javna pot

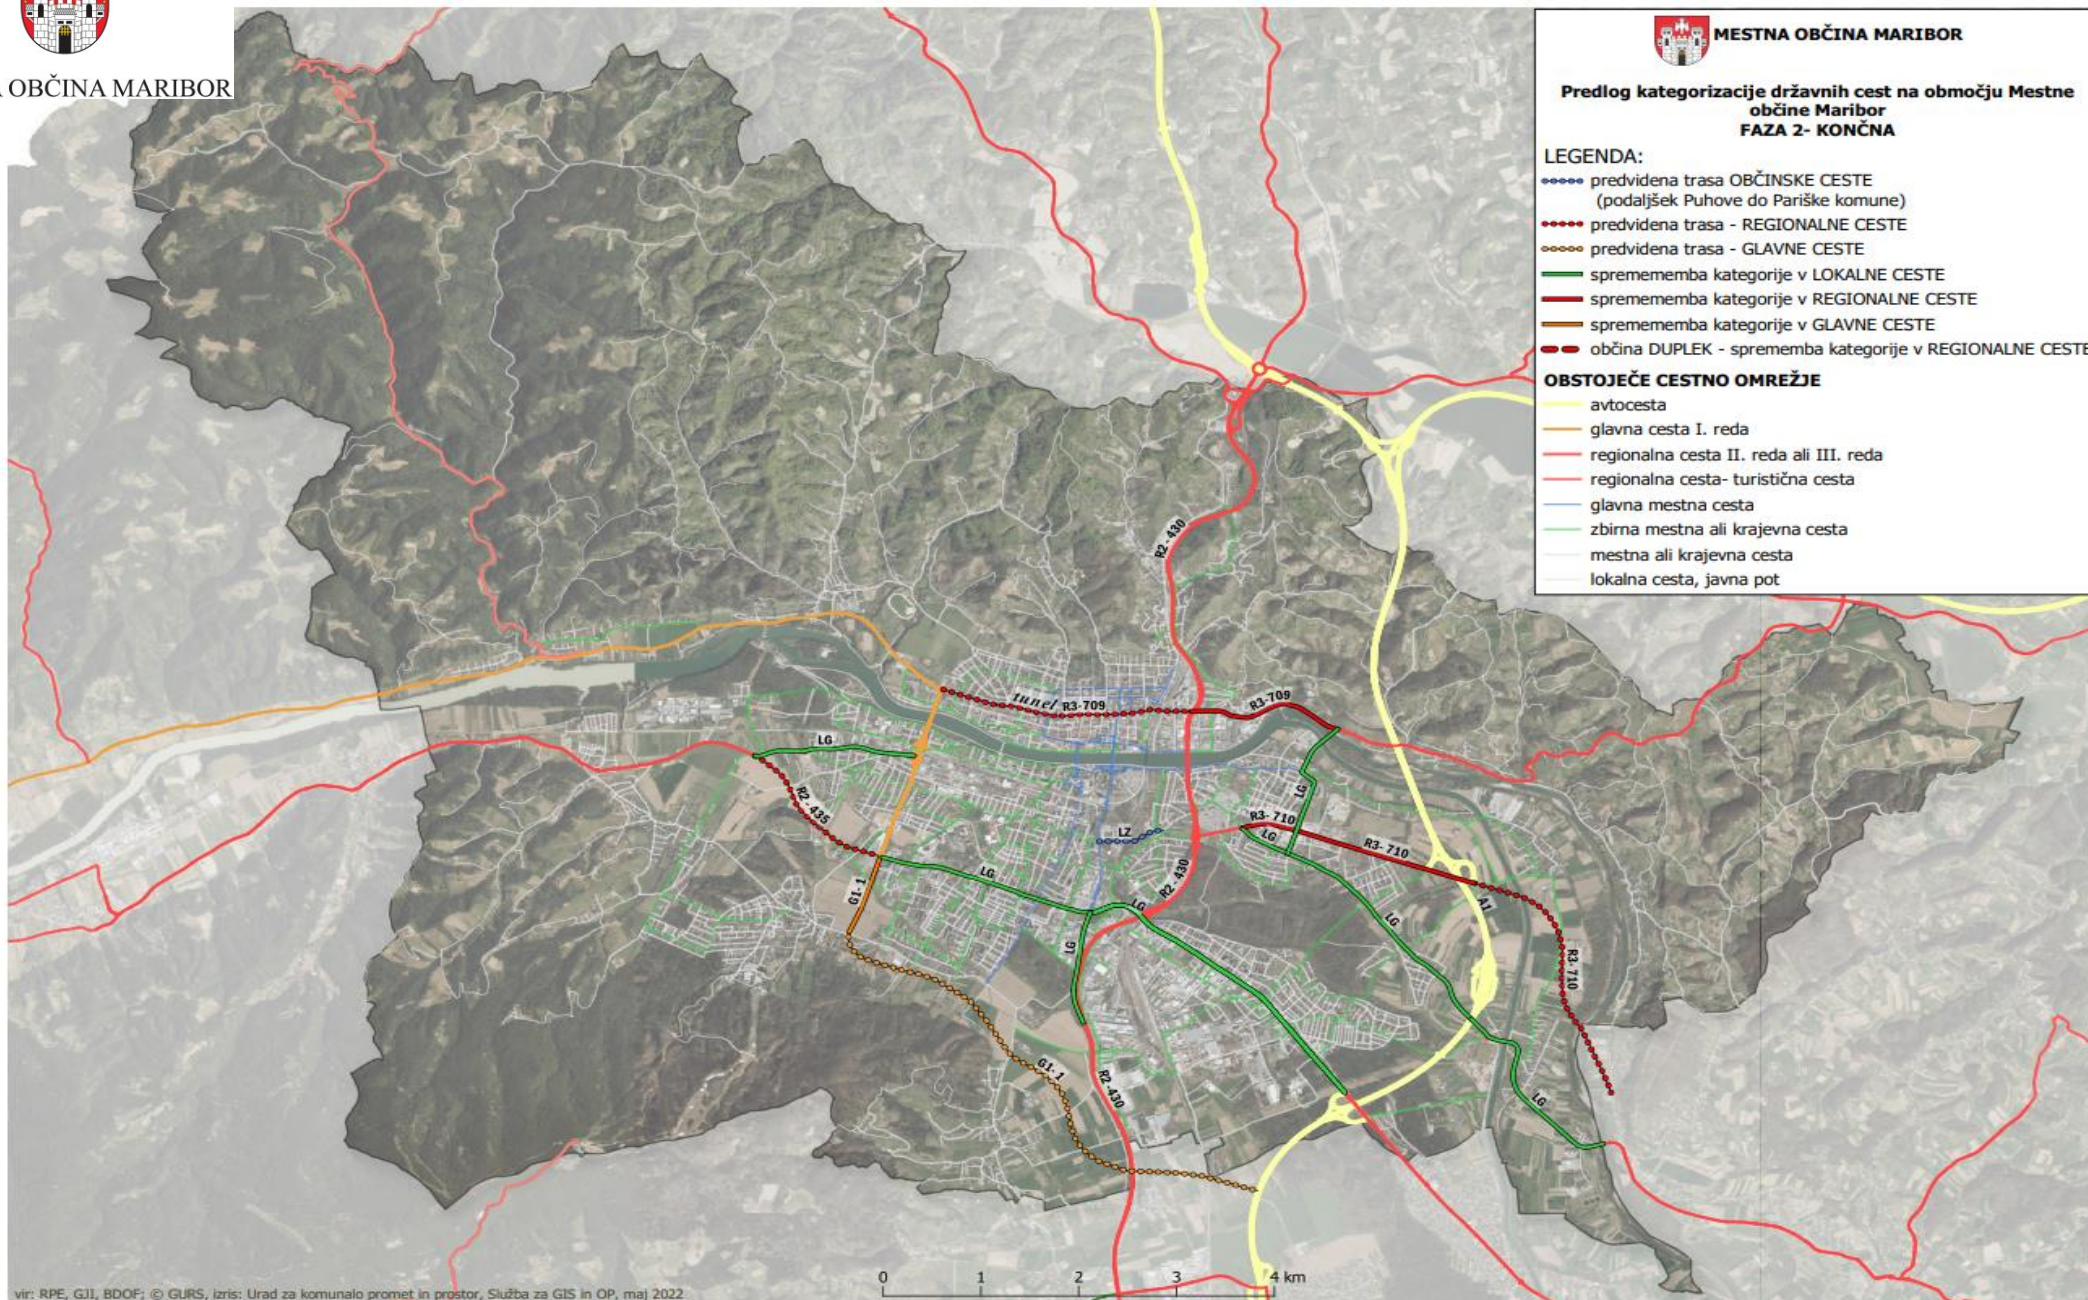

vir: RPE, GJI, BDOF; © GURS, izris: Urad za komunalo promet in prostor, Služba za GIS in OP, maj 2022

# Infrastrukturni projekti na območju MOM – državni projekti, ki so v teku ali potekajo predhodne aktivnosti



MESTNA OBČINA MARIBOR


- Cesta podaljšek proletarskih brigad – zaključek gradnje 2022
- ZO MB I. etapa nadaljevanja – razpis predvidoma v juniju 2022, pričetek gradnje 2022
- Krožišče Streliška - Kardeljeva (navezovalna cesta na ZO) – razpis v teku, pričetek gradnje 2022
- DPN ZO MB z navezavo na A1 – sprejem DPN 2023, realizacija 2027
- Mestni predor, kot del prometnega obroča mesta – podpisan Protokol z MZI
- Preboj Pariške komune – izdelava DGD v letu 2022, v letu 2023 pridobitev GD in izdelava PZI
- Mobilnostno vozlišče Maribor v železniškem trikotniku – v letu 2022 sprejem OPPN in razpis za izdelavo DGD ter izdelava DGD
- Malečniški most – prenos na DRSI izveden, priprava projektne naloge za izdelavo projektov DGD in PZI
- Priključna cesta - cesta v Cono Pobrežje – izvedba v teku, zaključek do konec julija 2022
- Podaljšek Puhove - s priključitvijo na novi most v Dupleku – v letu 2022 razpis za izdelavo študije variant
- Rekonstrukcija regionalne cesta v Malečniku R3 709 – razpis za izvedbo del predviden v prvi polovici 2023
- Regionalna cesta v Bresternici - razpis za izvedbo del predviden v prvi polovici 2023
- Ukrepi umirjanje prometa v Dogošah - v izvedbi, zaključek del v juliju 2023
- Podvoz Ledina – DGD je izdelan, v letu 2022 bo pridobljeno GD in izveden bo razpis za izvajalca





# Cesta podaljšek proletarskih brigad

pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je pravnomočno nadaljevanje gradnje v začetku junija 2022  
– zaključek gradnje konec leta 2022

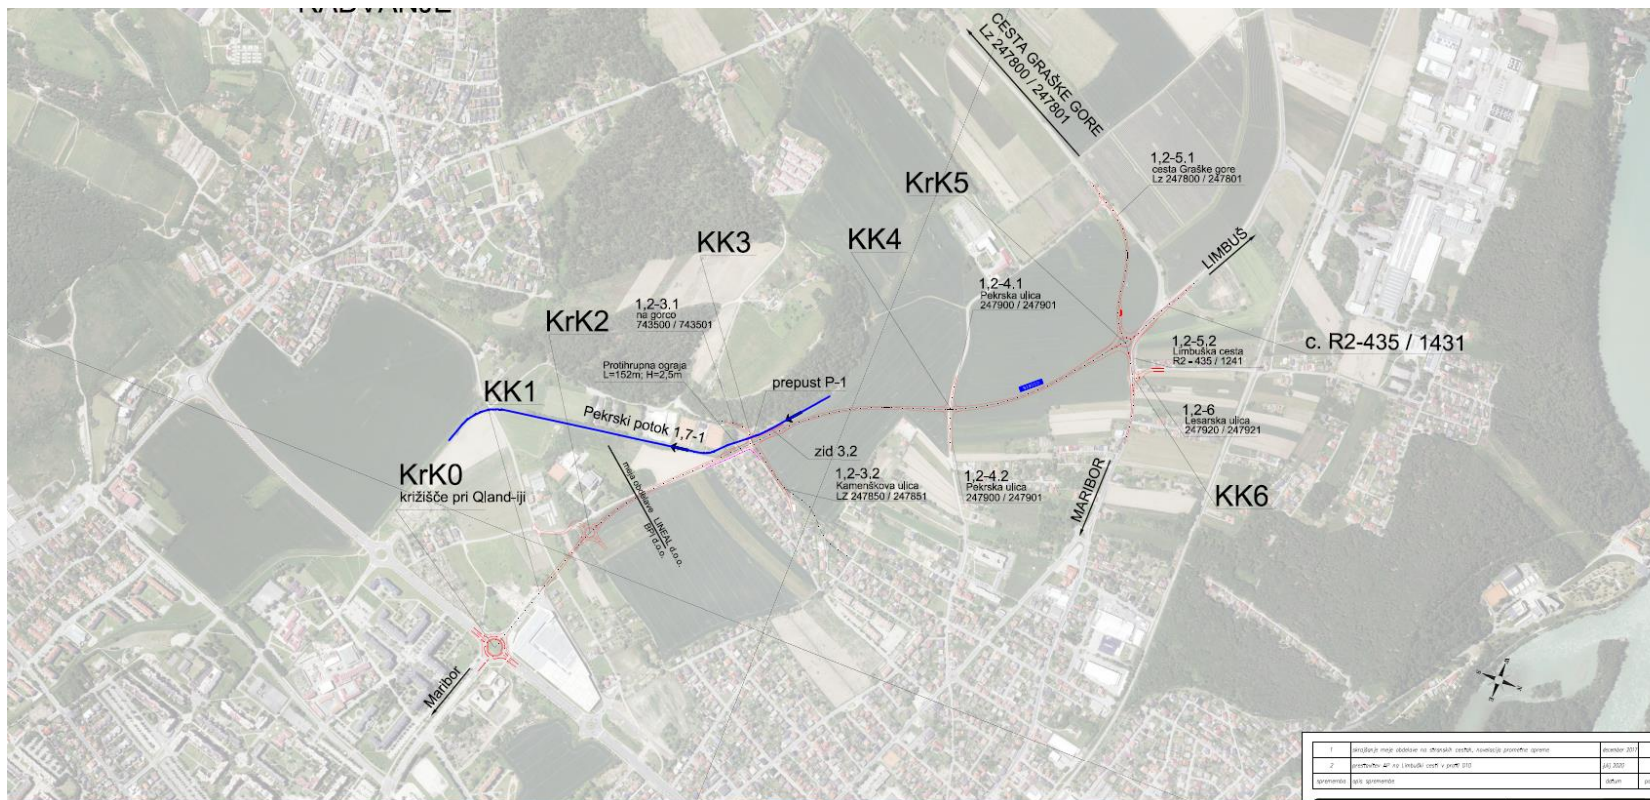






## Zahodna obvoznica, I. etapa

- ZO MB I. etapa (Streliška – Kardeljeva) – razpis bo objavljen do konec maja 2022, pričetek gradnje 2022
- Krožišče Streliška - Kardeljeva (navezovalna cesta na ZO) – razpis v teku, pričetek gradnje 2022





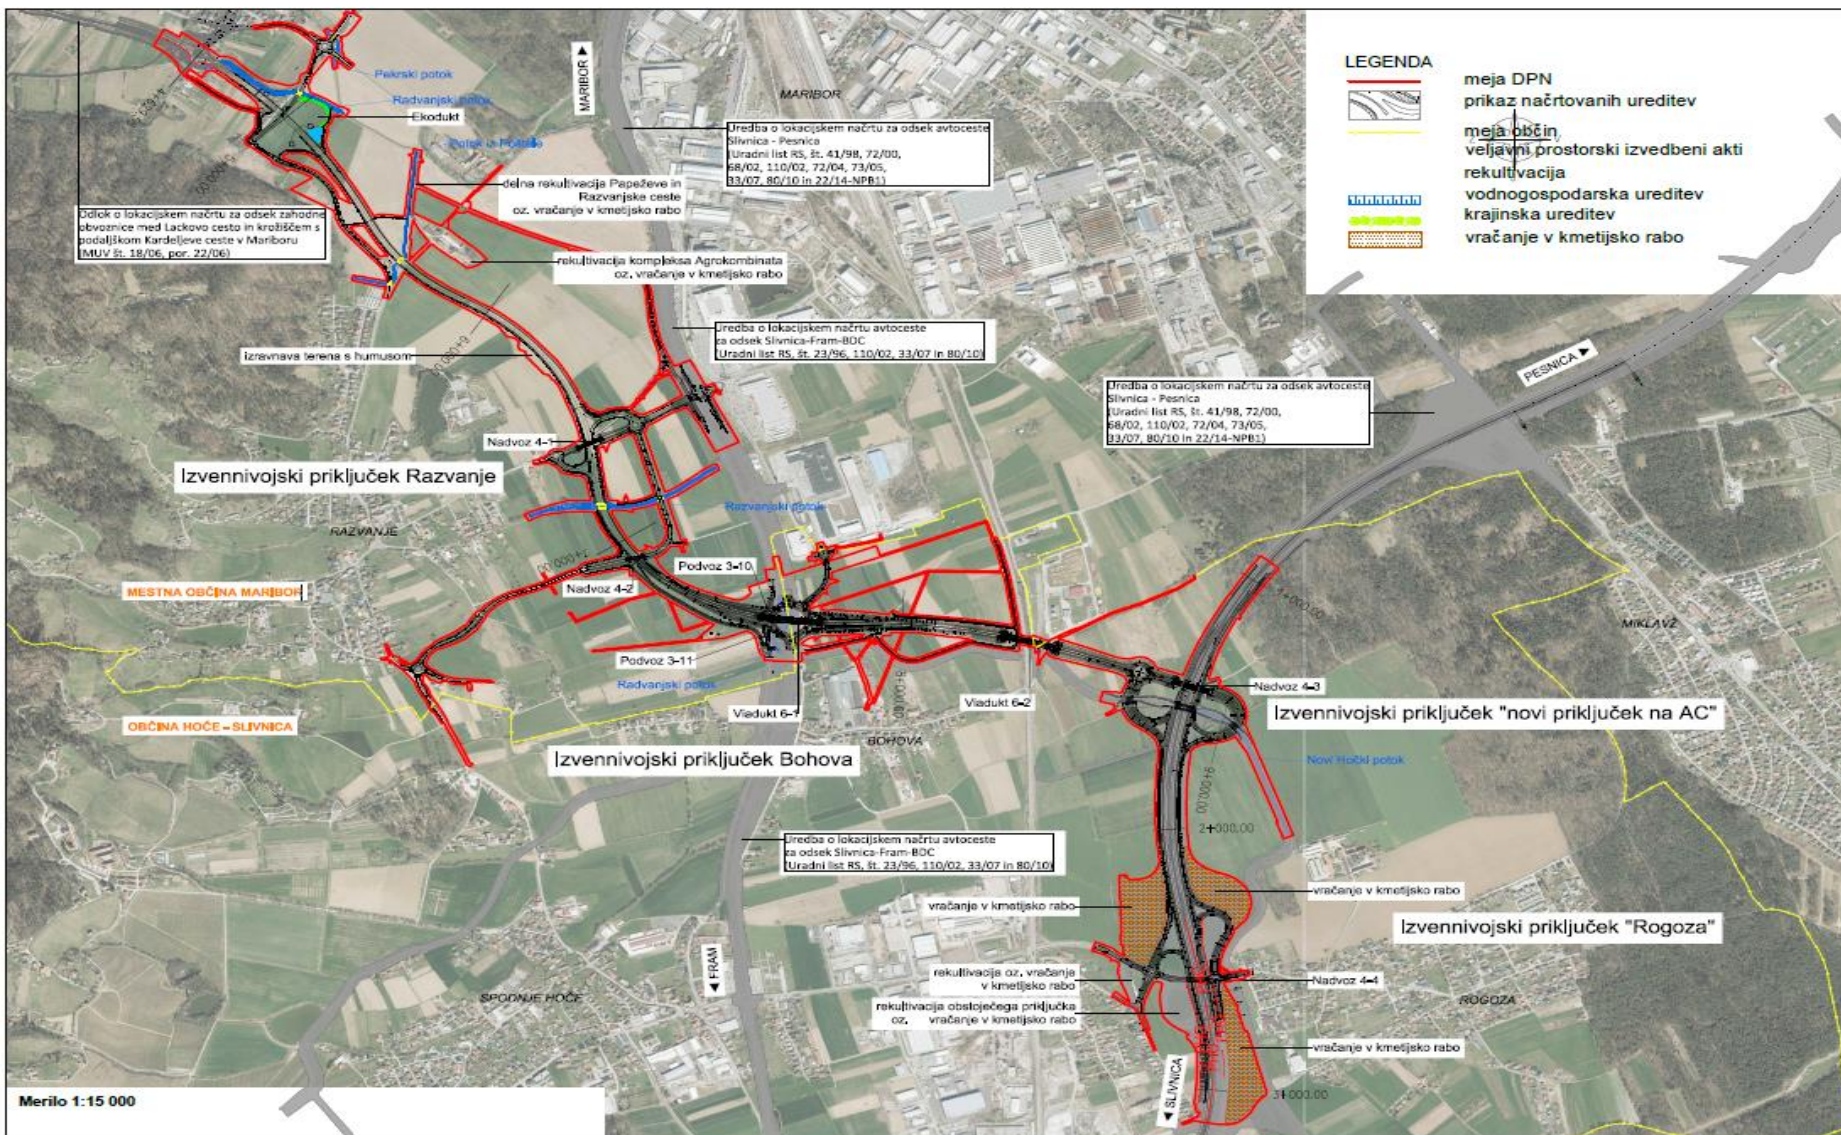




# Mestni predor

## **del prometnega obroča mesta – podpisan Protokol z MZI**

Dolžina predora je 1.500 m, pri čemer se trenutno predvideva hibridna izvedba predora z dodatnimi uvozno izvoznimi portali, ki bi se umestili na križišču Titova-Partizanska in Strossmayerjeva-Gospodsvetska. Smiselna izvedba bo natančneje definirana v naslednjih fazah projekta (analiza tveganj, hidravlična, hidrološka in geomehanska študija ter modeliranje prometa). Vrednost investicije je v študiji izvedljivosti ocenjena na 50 mio €.




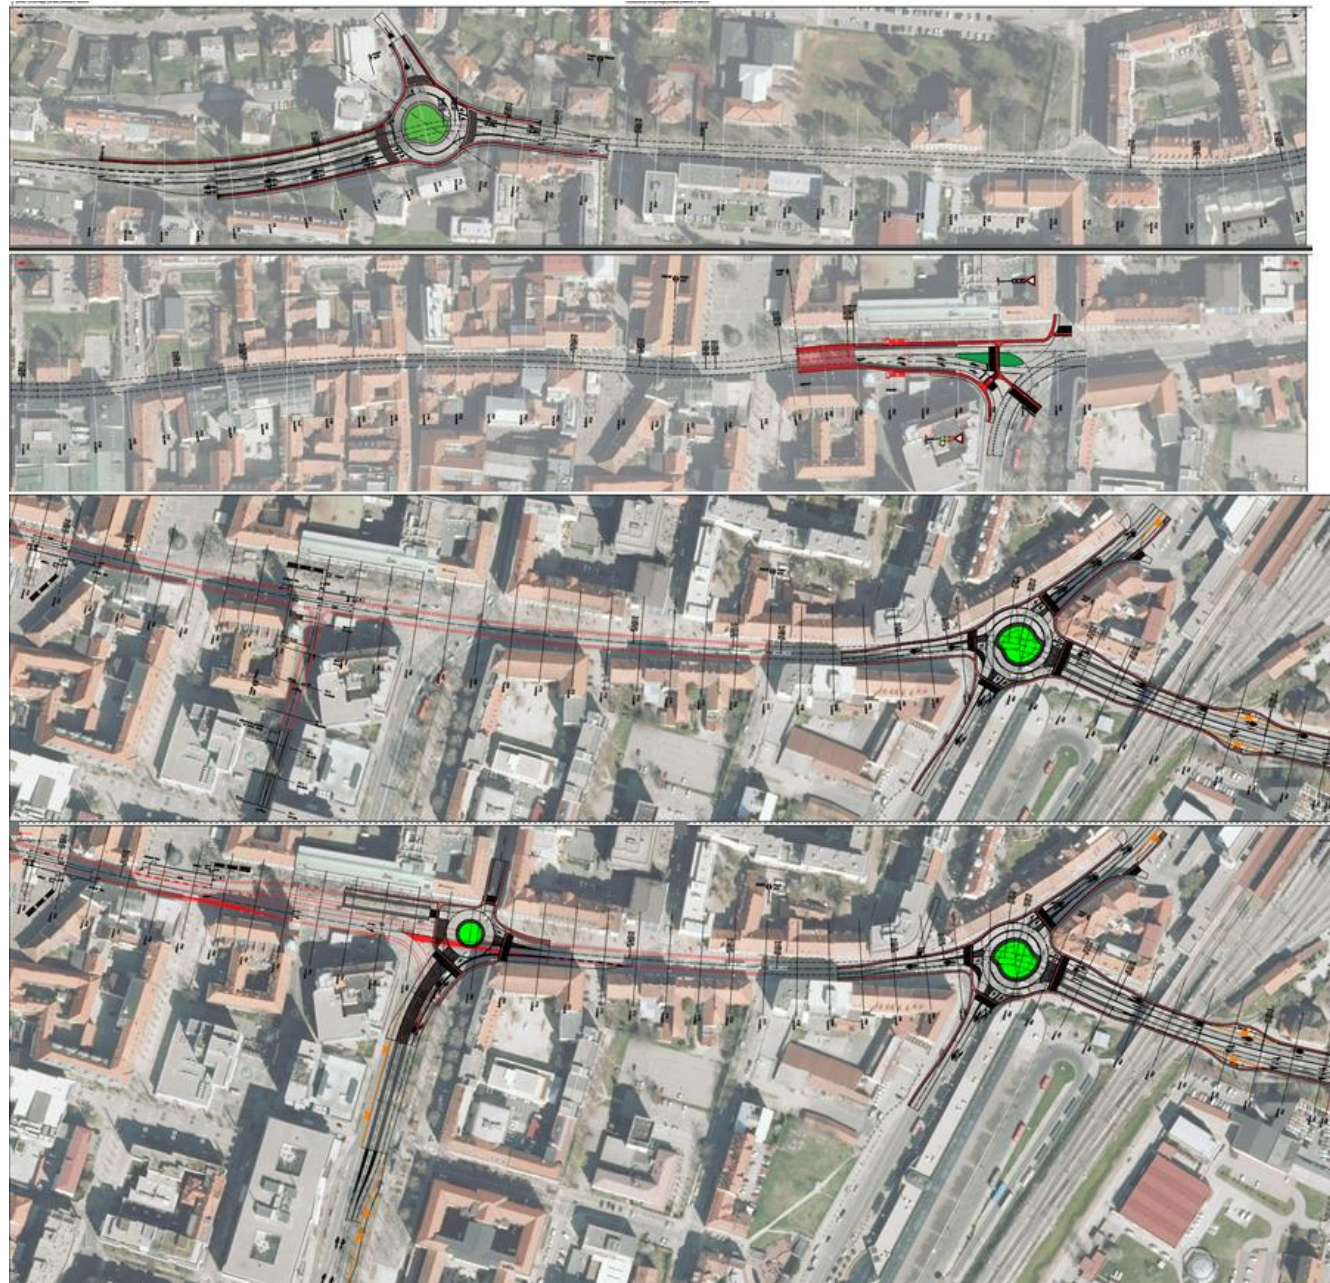





### KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ

NAGIB 2,5%  
M 1:50

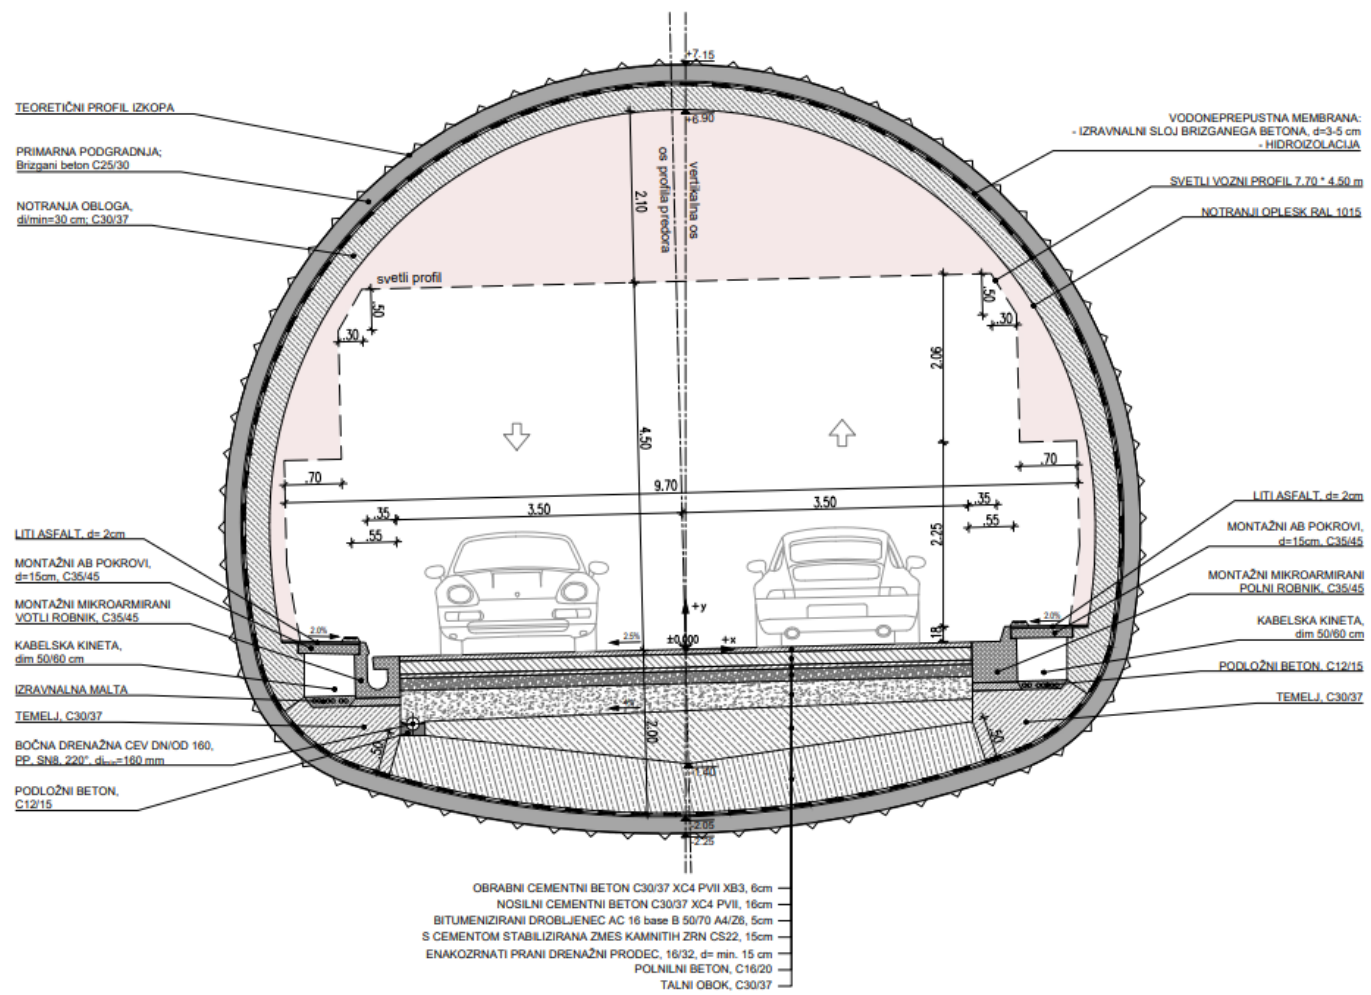

08. Maj, 2021 - 08:38  
Layout: 4.1 KPP - prečoz  
S:\\_a\_Građbeništvo\PPREDOR\5.1.0\MestniPredorMaribor\FAZA\_3\KONČNO\_POROČILO\PROLOE\PI\4.1\_KPP--preoz--predor.dwg



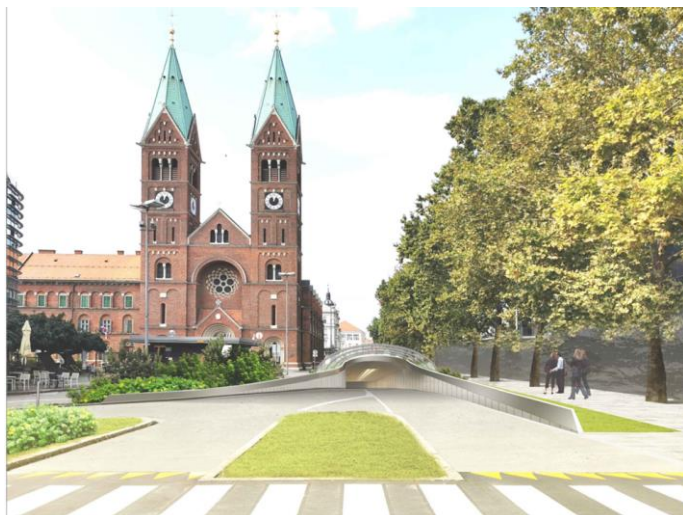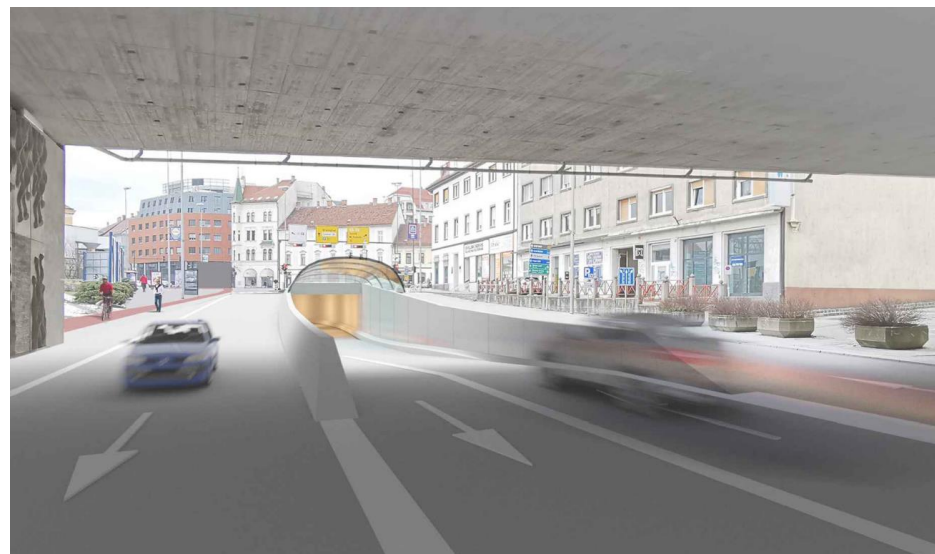




## Preboj Pariške komune – izdelava DGD v letu 2022, pridobitev GD v letu 2023 ter izdelava PZI

- Dolžina odseka znaša dobrih 600 metrov. Predvidena je izgradnja:
  - dveh krožišč,
  - podvoza pod železnico in
  - ureditev opornih zidov (gradnja v vkopu).

Vrednost investicije znaša 21 mio €.

Cesta, ki bo neposredno povezala Studence in Tabor s Pobrežjem, bo cestna povezava med Zahodno obvoznico in AC priključkom Zrkovci, ki bi potekala po trasi današnjih ulic Na poljanah – Koresovi – Ulici Pariške komune do Titove ceste, od tam pa po novi trasi s podvozom pod železniško progo do Nasipne ulice in naprej proti vzhodu preko izvennivojskega priključka na Hitri cesti in po trasi Puhove ceste do avtocestnega priključka Zrkovci. Na tem cca 6 km dolgem odseku manjka danes povezava med Titovo cesto in Nasipno ulico, vse ostalo je zgrajeno.



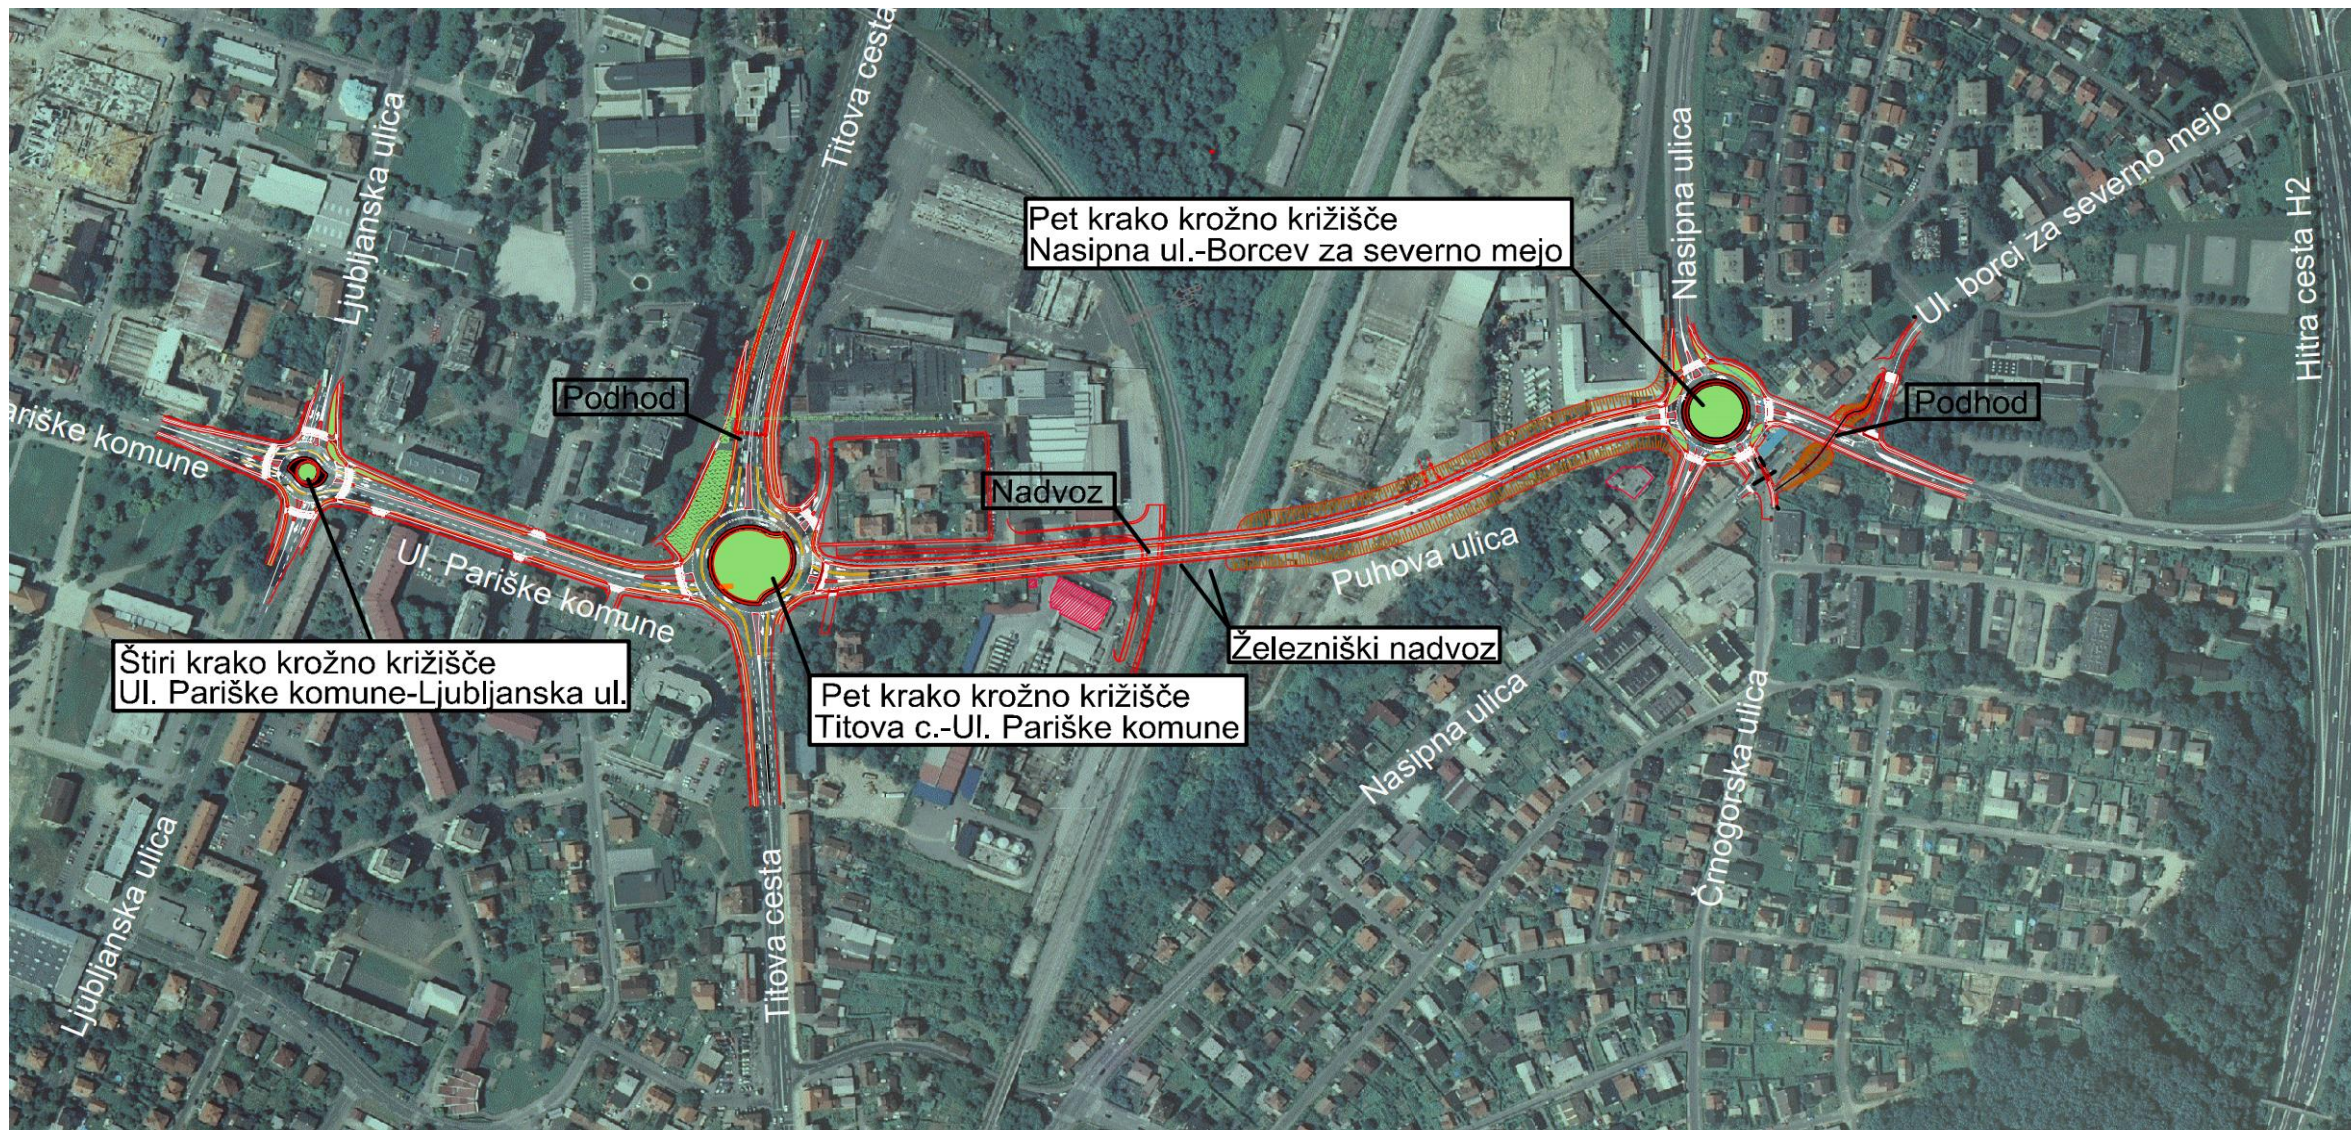





## Mobilnostno vozlišče Maribor v železniškem trikotniku – OPPN v letu 2022 in projektiranje DGD

Ocena investicije je 8 mio €. Predvideva se izvedba mobilnostnega vozlišča s parkirišči za osebna vozila, taxi, polnilnice za e-vozila, kolesarnica, PZA, sistem izposoje javnih koles, car sharing, sanitarije, gradnja nadstreškov s sončnimi elektrarnami, avtobusna in železniška postajališča, ureditev dostopnosti do mesta z dvigali, predvideva se možnost vgradnje hranilnika električne energije in gradnja centra za nadzor železniškega prometa za V Slovenijo.

Skupaj 1.000 parkirnih mest.







## Malečniški most

- V letu 2022 je bil izveden prenos na DRSI
- v letu 2018 so bili izdelani projekti, naročnik MOM, ki so pokazali, da je most statično v zelo slabem stanju
- V teku je izdelava DI-IP-a za Malečniški most, na podlagi katerega bo le-ta uvrščen v NRP za proračunsko obdobje 2022-2023. Načrtovano je, da bo v letu 2022 izdelana projektna naloga in pripravljen razpis za izdelavo PZI rehabilitacije mostu.





## Priključna cesta - cesta v Cono Pobrežje

dolžina dostopne ceste cca 200 m in cca 100 m odcepa

Vrednost investicije 1.541.957,42 EUR

izvedena bo priključna cesta, vodovod, pločnik

uvedba v delo 18.02.2022

zaključek del julij 2022







## Podaljšek Puhove - s priključitvijo na novi most v Dupleku

- Podaljšek Puhove - s priključitvijo na novi most v Dupleku – naročilo in izdelava študije variant v letu 2022 in projekt nadomestnega mostu





## Ukrepi umirjanje prometa v Dogošah

Vrednost investicije 265.272,70 EUR

delež MOM 48.275,72 EUR

izveden bo otok za umirjanje prometa, hodnik za pešce, posodobitev javne razsvetljave  
začetek del je bil v začetku marca 2022

zaključek del v juniju 2022







# Podvoz Ledina

- DGD je izdelan
- V teku je izdelava PZI
- Vloga za GD bo dana v juliju 2022
- razpis za izvajalca 2022





## Infrastrukturni projekti na območju MOM – občinske ceste

V letu 2022 bodo na območju MOM izvedene naslednje investicije

- Cesta K5 – K8
- Gregorčičeva ulica
- Ureditev nabrežja Lent
- Kare Medvedove in Kosarjeve ulice
- Ulica Koseskega na Taboru
- Cesta v Trčovi
- Ureditev Titove ceste
- Ureditev Trga Revolucije
- Preplastitve
- Izvedba ukrepov za umirjanje prometa





# Cesta K5 – K8 v poslovni coni Tezno

Vrednost investicije 1.597.168,16 EUR  
Uvedba v delo 15.04.2022  
zaključek del 30.07.2022





## Ureditev Gregoričeve ulice v Mariboru -1 .faza

- med Tyrševo in Grajsko ulico zajema parterno in komunalno ureditev ter izvedbo vročevoda od Grajske ulice do ulica Heroja Staneta 1.  
Vrednost investicije 1.102.458,07 EUR z DDV  
začetek projekta 23.11.2021, zaključek projekta 22.6.2022

Nova ureditev ohranja enosmerni promet in vzdolžno parkiranje, vendar le na južni strani vozišča.

Kolesarji so v eno smer predvideni na cestišču z motornimi vozili, v nasprotno smer pa na pločniku na severni strani.

Na južni strani bo ohranjen gabrov drevored, na severni strani pa bo zasajena nova linija dreves nižje sorte.

Vozišče bo asfaltirano.

Pločniki in parkirne površine bodo tlakovani z betonskimi tlakovci 100/100cm.

Vzdolž ulice bodo po južni strani nameščene klopi prodniki z napisi povzetimi iz poezije.







## Ureditev nabrežja Drave - Lent

Koncept arhitekturno krajinske ureditve predvideva enotno celotno podobo obrežja reke pod nekdanjim obzidjem srednjeveškega Maribora. V tem delu se bo vsa površina pred objekti novo tlakovala in spustila do nivoja reke Drave preko dolgega in položnega stopnišča. Sofinancerja projekta sta Evropski sklad za regionalni razvoj in Mestna občina Maribor.






## Kare Medvedova, Kosarjeva

Skupna vrednost investicije je 4,5 mio €. Predvidena je izgradnja:

- dveh krožišč (rekonstrukcija obstoječih križišč) in
- celotna komunalna in prometna ureditev območja,

omejenega z Vrbansko, Turnerjevo in Gosposvetsko cesto. Predvidena je tudi ureditev javne razsvetljave, ukrepov za umirjanje prometa ter reševanje parkirnega režima okoli trgovine Mercator.

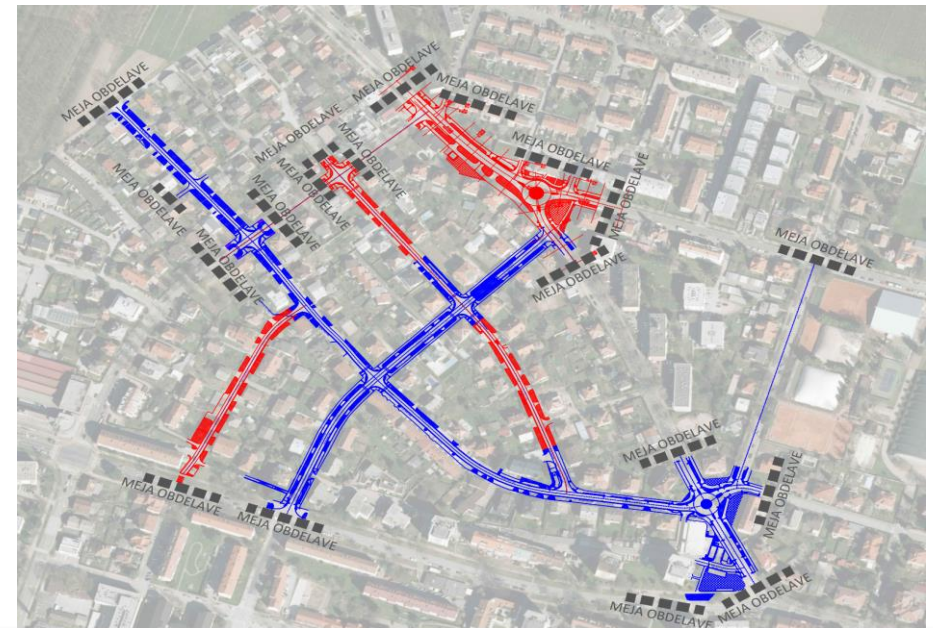





## Koseskega ulica na Taboru

ureditev ceste/ulice v dolžini cca 400 m  
prometna in komunalna ureditev  
vrednost del je ocenjena na 900.000 EUR

v teku je razpis  
pričetek del in izvedba v letu 2022





MESTNA OBČINA MARIBOR

# Cesta v Trčovi

Vrednost investicije 439.913,73 EUR

Uvedba v delo je bila v septembru 2021


Zaključek del začetek junija 2022








# Ureditev Titove ceste

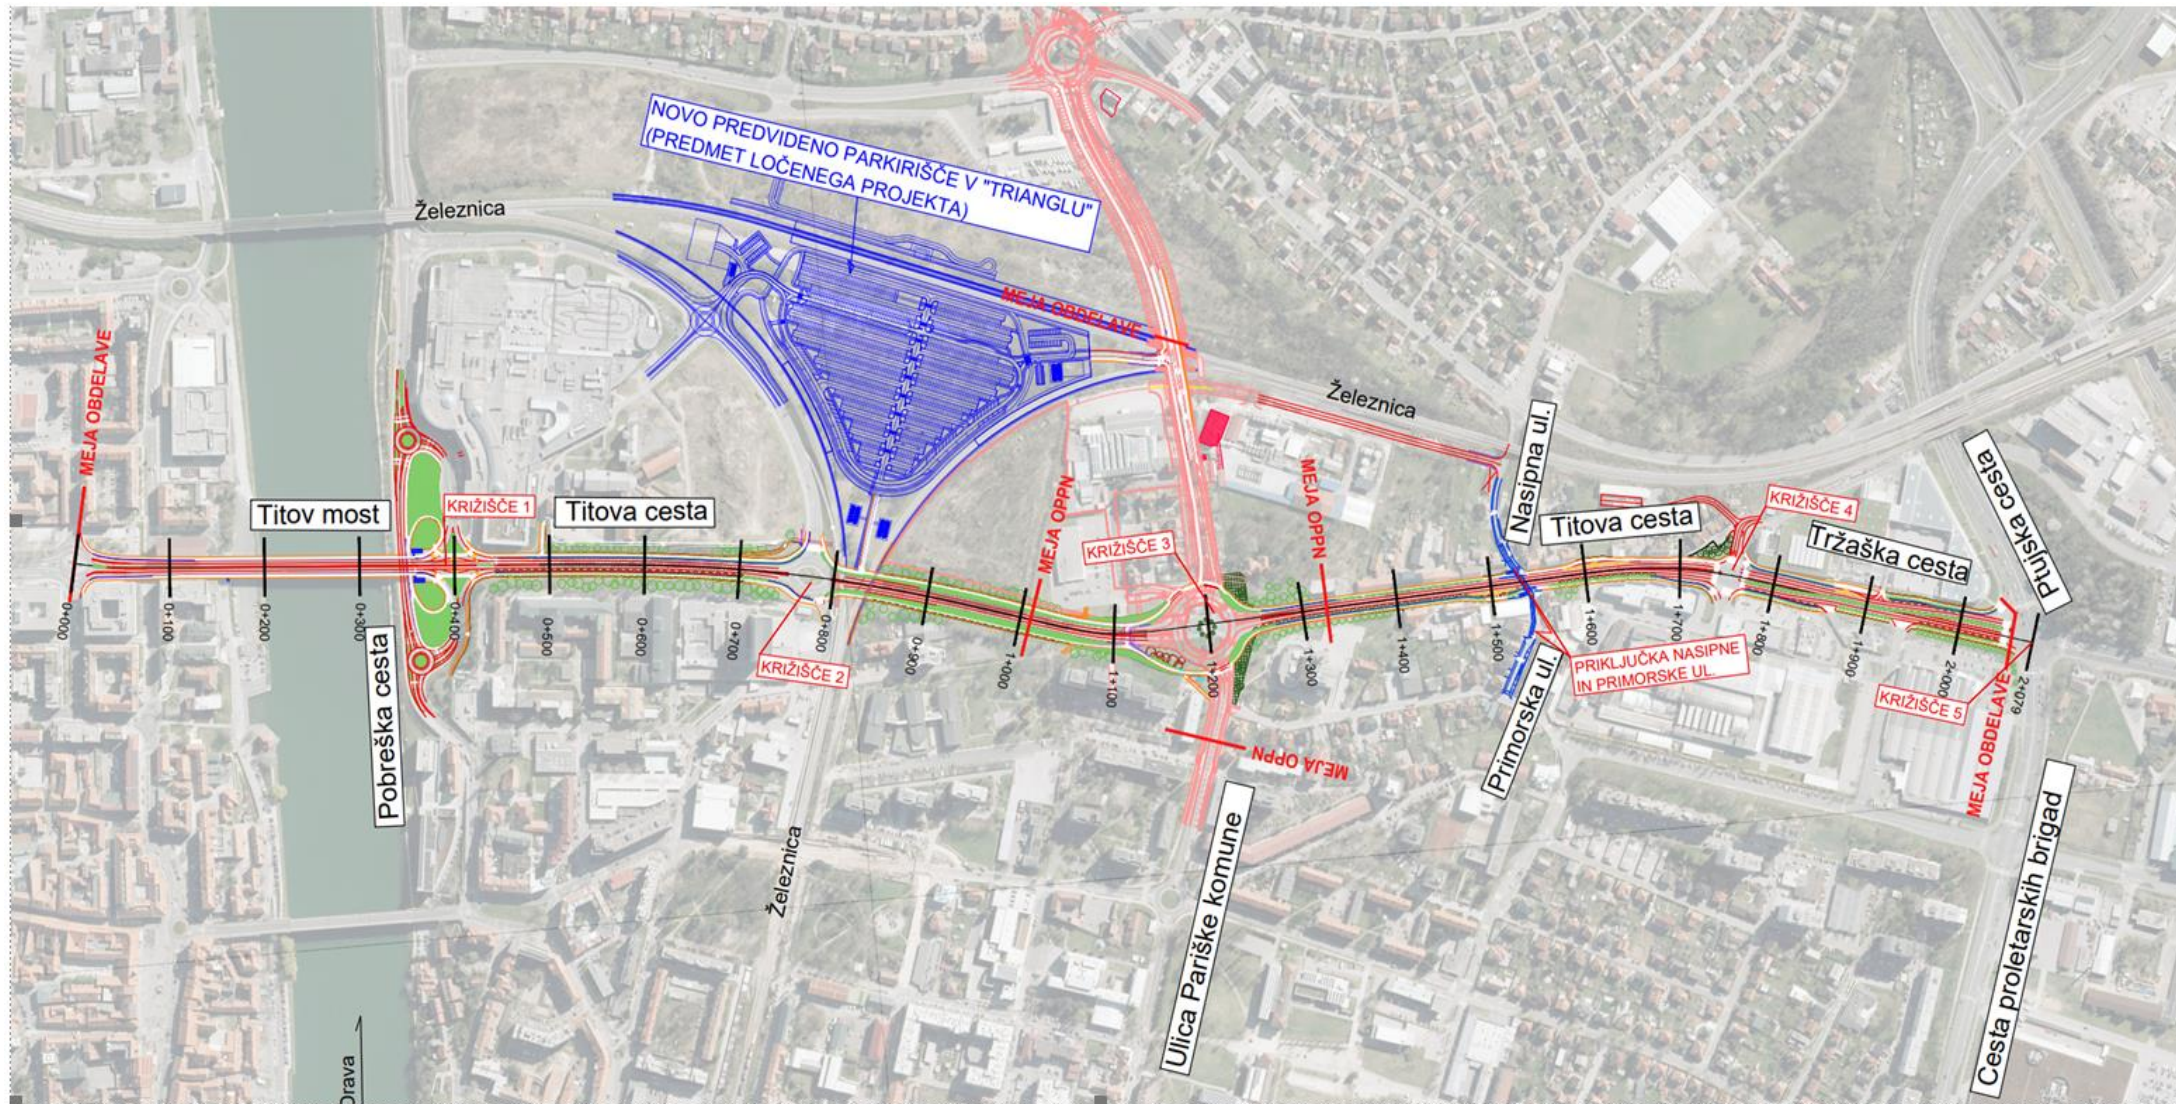





# Ureditev Trga Revolucije

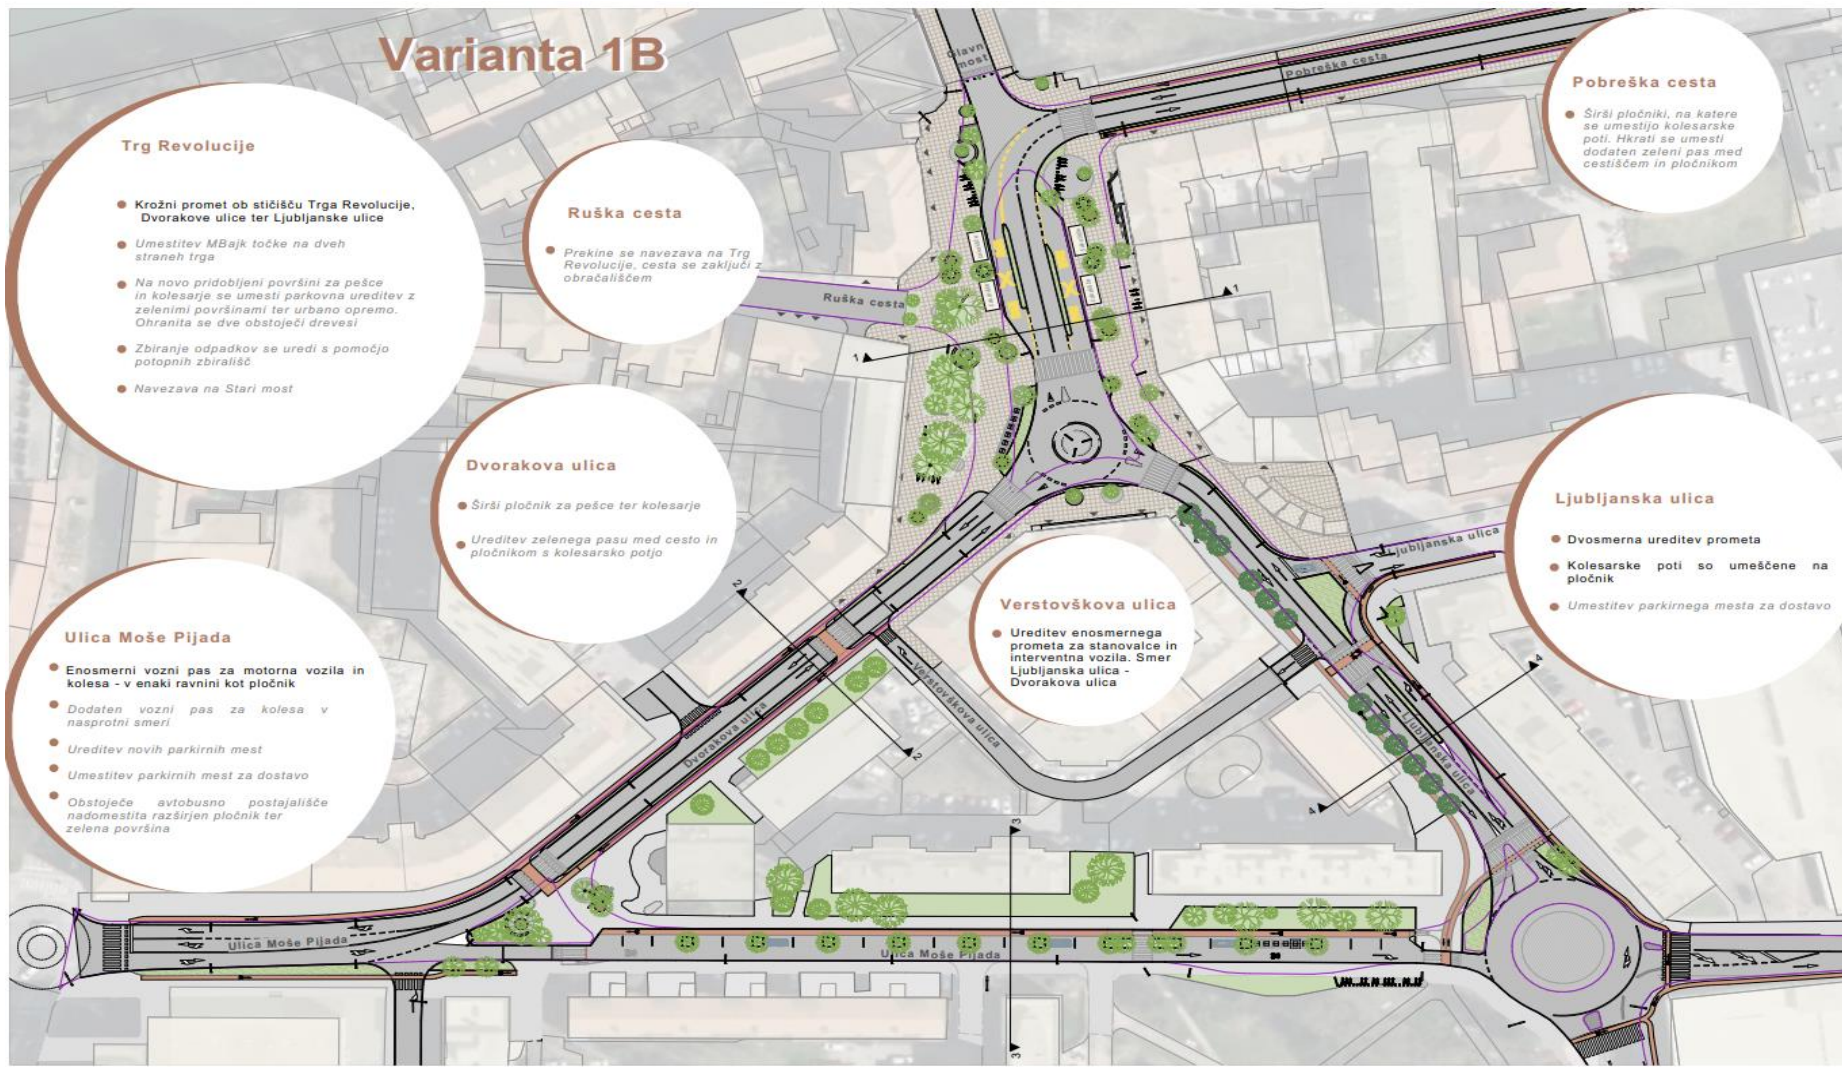





# Preplastitve

Izvedena dela:

CESTA MED ARENO IN VZPENJAČO

CESTA OD ARENE DO VODNEGA ZAJETJA

V izvajanju:

CESTA PROTI ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI


GORKEGA

UREDITEV PREKOPOV NA POHORSKI ULICI

V planu:

KRIŽIŠČE OSOJNIKOVA IN ČUFARJEVA

UREDITEV PARKIRIŠČA PLINARNIŠKA

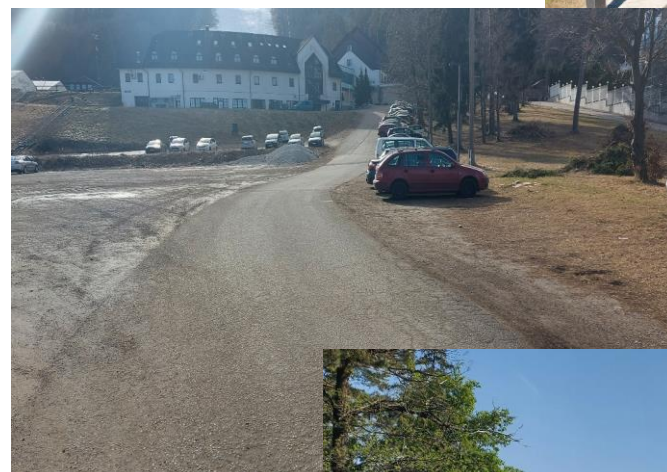



Hvala za vašo pozornost
